


## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 10.40 от 25.10.2022 г.

На поставку модульного здания: 6х7,3х3,61 в количестве 1 шт.

Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение на поставку модульного здания: 6х7,3х3,61 в количестве 1 шт.

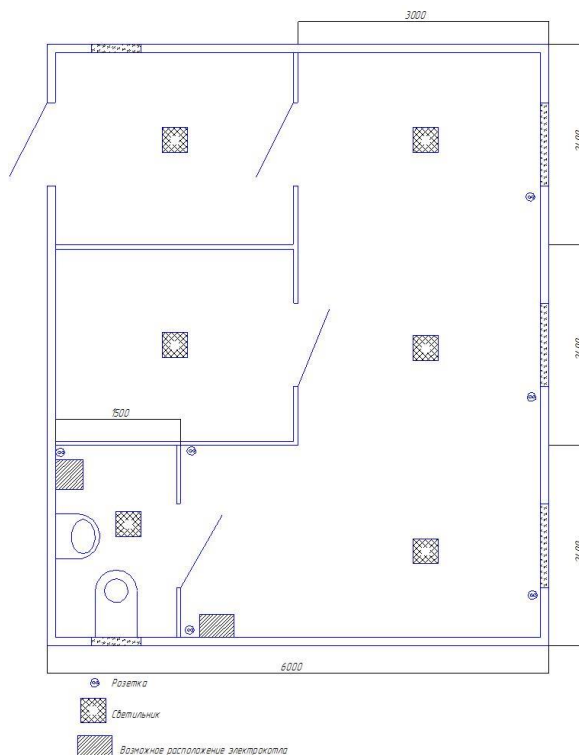

### Технические характеристики:

№	Раздел	Описание
1	Размер одноэтажного модульного здания:	6х7,3х3,61 м, общей площадью: 43,8 м <sup>2</sup>
2	Каркас металлический:	Рама металлическая из специализированного холодногнутого профиля для данного вида конструкций: Швеллер 100 мм, Уголок 63 мм Окрашен грунт эмалью 3 в 1
3	Каркас деревянный:	Потолок - пол - стены: Брус 100х50 мм Обработан огнебиозащитой
4	Кровля БК:	Плоская, сварная, покрытая грунтовой краской: Лист х/к 0,8 мм Швы проклеены лентой герметиком.
5	Кровля МЗ:	Каркас сварной. Кровля двухскатная, 7700х6400х1000 мм, с учётом выноса кровли 200 мм, с водосточной системой. Материал покрытия: Профилированный лист МП20 с полимерным покрытием 0,4 мм. Материал фронтона: Профилированный лист С8 с полимерным покрытием 0,4 мм.
6	Утеплитель: потолок/пол/стены/перегородки:	Негорючий Рулонный утеплитель: 100 мм / 100 мм / 100 мм / 50 мм Гидроизоляционная плёнка в комплекте

7	Отделка пола:	Подшивка основания металлическим листом: Лист х/к 0,5 мм; Черновой пол: Доска 100х25 мм (шаг 100 мм); Чистовой пол: ДСП 16 мм; Покрытие пола: Линолеум бытовой.
8	Отделка потолка:	Панель ПВХ, цвет белый
9	Отделка внешней стены:	Профилированный лист С8 с полимерным покрытием 0,4 мм
10	Отделка внутренней стены:	Панель МДФ, цвет дуб светлый
11	Перегородки:	Панель МДФ, цвет дуб светлый
12	Окна:	Окно ПВХ поворотно-откидное 1000х1100 мм (профиль трёхкамерный, 2 стекла) - 3 шт Окно ПВХ откидное 500х500 мм (профиль трёхкамерный, 2 стекла) - 2 шт
13	Двери:	Дверь металлическая "Эконом" с замком и ручкой 1950х800 мм - 1 шт Дверь МДФ Межкомнатная с ручкой 2000х800 мм - 3 шт
14	Электрика:	Выключатель автоматический однополюсный 10А С - наличие Выключатель автоматический однополюсный 25А С - наличие Светильник НПП-60Вт 195х105х75 мм IP54 - 2 шт Светильник светодиодный ДВО-36Вт 595х595х19 мм IP20 - 4 шт Розетка наружная двойная IP20 - 6 шт Выключатель наружный одинарный IP20 - 4 шт Щит распределительный навесной металлический (220 В) - наличие
15	Водоснабжение/Канализация:	Раковина керамическая 500 мм - 1 шт Унитаз - 1 шт

№	Раздел	Стоимость
1	Модульное здание:	546 995,00 ₽
2	Линолеум бытовой:	22 944,00 ₽
3	Электрика:	22 204,00 ₽
4	Водоснабжение и канализация:	21 418,00 ₽
5	Кровля:	102 017,00 ₽
6	Итого:	715 578,00 ₽
7	Монтаж:	208 050,00 ₽
8	Доставка манипулятором г.Ростов-на-Дону:	51 000,00 ₽
9	<b>Итого (без НДС):</b>	<b>974 628,00 ₽</b>

**Уведомляем Вас, что коммерческое предложение действительно 3 рабочих дня с даты выставления.**

<b>Срок производства:</b>	20-25 рабочих дней
<b>Гарантийный срок:</b>	6 месяцев
<b>Кран:</b>	Кран на выгрузке предоставляет <b>Заказчик</b>
<b>Условия оплаты:</b>	80% предоплата, 20% за 2 (два) дня до отгрузки.
<b>Установка производится на подготовленную Заказчиком площадку</b>	

**Ваш специалист: менеджер Яна Юрченко  
Телефон: +7 (999) 692 42 06**
